



PROGRAMME ÉCOSYSTÈMES FRAGILES D'AFRIQUE CENTRAL ECOFAC-6

COMPOSANTE COMPLEXE DES AIRES PROTÉGÉES
DU NORD-EST DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RAPPORT INTERMÉDIAIRE N° 2
VERSION EXÉCUTIVE | 2021

CONTRAT
FED/2018/404-35 4

PÉRIODE DE RÉF
31 JANVIER 2019 AU 30 JANVIER 2023

FINANCEMENT
UNION EUROPÉENNE/ PIR 11E FED

OPÉRATEUR
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

1 ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE L'ACTION ET DES RÉSULTATS

Ce deuxième rapport intermédiaire compte pour la période allant du 1^{er} février 2020 au 31 janvier 2021. Il met en exergue les activités réalisées, le niveau d'atteinte des valeurs cibles inductrices de chacun des produits devant concourir à générer les résultats et conséquemment l'effet escompté du programme à savoir, **Préserver la diversité biologique et les écosystèmes fragiles, en lien avec les services écosystémiques associés.** De son contenu se dégagent deux (2) cas de figures.

VOLETS À FORTS NIVEAUX D'ATTEINTE DES VALEURS CIBLE

Sont concernés dans ce cas de figure cinq (5) des sept (7) volets du programme. Après deux années sur quatre d'exécution du projet, la majorité des valeurs cibles de ces 5 volets est portée à de 60% pour certaines ou 100% pour d'autres. Ces cinq volets sont les suivants :

VOLET SPÉCIFIQUE 2 GESTION/MONITORING DES ÉCOSYSTÈMES ET DES POPULATIONS FAUNIQUES ET LAB AMÉLIORÉE

RÉSULTAT 2. Les écosystèmes sont mieux conservés et la faune est mieux gérée, grâce entre autres au contrôle des activités illicites ou non régulées (braconnage, élevage transhumant, exploitation minière ou forestière, etc.), et au monitoring écologique.

- ✓ 40 éco-gardes hérités d'ÉCOFAUNE+ formés, contractualisés et opérationnalisés, et 10 éco-surveillants, aspirants éco-gardes en formation. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 68%
- ✓ Un (1) salle de contrôle dédié au suivi en temps réel des opérations de terrain est mis en place et rendu opérationnel. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%
- ✓ Une (1) stratégie de collecte d'informations (intelligence) impliquant plusieurs acteurs de différents bords est mise en œuvre y compris pour l'alerte précoce. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%
- ✓ 22 gardes communautaires et agents de sécurité ainsi que 45 tangos (agents régulateurs de la transhumance) sont contractualisés et participent à la mise en œuvre de la stratégie de collecte d'informations. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 73%
- ✓ 75% des besoins en équipements et travaux d'infrastructures prévus dans le cadre du projet sont exaucés (4 véhicules, 2 avions mobilisés, équipements techniques, uniformes pour les éco-gardes, plus de 300 km de pistes de surveillance ouvertes et/ou rouvertes, 8 pistes d'atterrissage d'avions ouvertes [...]

[...] et/ou rouvertes). VALEUR CIBLE ATTEINTE À 75%

- ✓ Armorerie de la base opérationnelle renforcée, armes et munitions héritées inventoriées, triées et rangées, procédure d'acquisition de nouvelles armes impactée par les mesures d'embargo. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 40%
- ✓ La capacité d'accueil du complexe bureau de la base opérationnelle de Bamingui est élevée de 6 bureaux à 11 et une poudrière, le complexe bureaux clôturé pour besoin de sécurité, l'un des trois logements des cadres, aménagé en deux compartiments distincts, et deux anciens blocs de chambres de passage du personnel local aménagés pour servir de logements à 8 employés. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%
- ✓ Les efforts de patrouille sont passés de 366,6 h/j de patrouilles par mois et 777 km parcourus par écocarde / mois en 2018 à 654 h/j de patrouille par mois, 1.088 Km parcouru par mois en 2020.
- ✓ 956 convoyeurs de troupeaux venus du Tchad et du Soudan contactés et sensibilisés dans l'optique qu'ils ne puissent pas rentrer dans les noyaux durs de conservation mis en place dans les aires protégées. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%
- ✓ 85% de transhumants sensibilisés n'impactent pas le noyau dur de conservation mis en place dans le Parc National Bamingui-Bangoran. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 85%
- ✓ Le nombre de campements de braconniers/pêcheurs installés le long de la rivière Bamingui est réduit à 2% (156 à 3). Le nombre de campements de braconniers à l'intérieur du noyau dur de conservation du Parc National Bamingui-Bangoran est réduit à 43% (de 23 début saison de chasse à 10 fin saison de chasse). Nouveau Code de Gestion de la Faune et des Aires Protégées promulgué. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 50%
- ✓ 5.000 Km² du Parc National Bamingui-Bangoran sous contrôle VALEUR CIBLE ATTEINTE À 83%

- ✓ 6 partenaires actifs au cours de la période : La facilitation du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), l'UNESCO, APN Tchad, ARCADIA, le Lion Recovery Funds, USFWS. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%

VOLET SPÉCIFIQUE 4 PLANIFICATION, CONTRÔLE ET GESTION PARTICIPATIVE DE LA GRANDE TRANSHUMANCE

RÉSULTAT 4. La problématique de la grande transhumance est traitée globalement et de manière intégrée, grâce à la coordination d'acteurs, en vue de minimiser ses impacts négatifs sur les écosystèmes et la biodiversité.

- ✓ Une (1) stratégie mise en place à travers l'opérationnalisation du système Tango (45 éco-régulateurs de la transhumance), et le suivi et téléguidage en temps réel de la salle des opérations. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%
- ✓ Cinq (5) mécanismes ou plateformes actifs et accompagnés par le projet : La plateforme locale sur la transhumance, la plateforme nationale sur le pastoralisme et la transhumance, le mécanisme régional de suivi de la Conférence de N'Djamena coordonné par la facilitation du PFBC, le CTPE et le CTSA mécanismes de suivi de l'accord tripartite (Cameroun, RCA, Tchad) de lutte anti-braconnage. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 70%.
- ✓ Accord entre déléguées des transhumants et plateformes locales de gestion intégrée des ressources naturelles subordonné à la création des Territoires de Développement Endogène et Durable (TeDED). VALEUR CIBLE ATTEINTE 0%
- ✓ Processus de révision du Schéma Directeur d'Aménagement du Territoire en cours (collecte de données). VALEUR CIBLE ATTEINTE À 25%
- ✓ Mise en œuvre d'un plan d'action d'urgence du volet gestion de la transhumance portant sur quatre points : 1. Campagne de recrutement des Tangos (éco-régulateurs et de la transhumance) ; [...]



[...] 2. Formation des Tangos, 3. Équipements des Tangos et leur déploiement sur le terrain ; 4. Collecte d'informations sur la dynamique de transhumance, 5. Sensibilisation des transhumants. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 70%

✓ Acteurs impliqués dans la dynamique de la transhumance identifiés et cartographiés dans l'optique de la définition des droits, devoirs et intérêts de chaque groupe d'acteurs ou groupe d'intérêt. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 30%

✓ Trois (3) projets des partenaires actifs au cours de la période et accompagnés par WCS : 1. Projet d'élaboration des Plans Locaux de Développement des trois communes de la zone réalisée par le PNUD en se conformant aux orientations du SDAT ; 2. Projet de restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière (RCA/Tchad) piloté par la FAO ; 3. Projet BIOPALT (Biosphère et patrimoines du Lac Tchad). Deux (2) initiatives de l'UE actives en 2021 basées sur une approche Paysage avec pour opérateur WCS : 1. Projet BC Chari (Bloc Centre entre le Tchad et la RCA) ; 2. Projet PAIRIAC/Transhumance transfrontalière entre Tchad, RCA et Cameroun. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 60%

✓ Une (1) initiative transfrontalière active coordonnée au cours de la période : Mécanisme régional de suivi de la conférence de N'Djamena sur la sécurité, la lutte anti-braconnage, l'encadrement de la transhumance et la circulation des groupes armés entre le Sahel et l'Afrique Équatoriale, coordonné par la facilitation du PFBC (Leadership du Bloc Centre assuré par WCS). Deux (2) initiatives transfrontalières de l'UE à coordonner par WCS envisagées pour 2021 et basées sur une approche Paysage : 1. Projet BC Chari (Bloc Centre entre le Tchad et la RCA) ; 2. Projet PAIRIAC/Transhumance transfrontalière entre Tchad, RCA et Cameroun. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 70%



VOLET TRANSVERSAL 1

COORDINATION ET COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE/INTERNATIONALE

RÉSULTAT 5. L'accord avec le gouvernement est mis en place. Une coordination nationale et territoriale/locale est assurée. Des concertations sur les questions transfrontalières et des collaborations avec les projets analogues placés dans les pays voisins sont développées.

✓ Deux (2) visites sur zone du Ministre des Eaux et Forêt et ses spécialistes, une (1) visite du programme régional de WCS Soudano-Sahel, deux (2) visites des spécialistes de l'UNESCO, et des visites périodiques des collègues humanitaires de Première Urgence, OCHA, Solidarité International et OIM. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%

✓ 60% des dispositions de l'Accord de Partenariat signé le 21 décembre 2018 mise en application. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 60%

✓ Signature par le 1^{er} Ministre de la décision portant création du Comité National des Aires Protégées et de leur périphérie (CAPEP National) | Signature par le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération/ON FED de la Décision portant création du CAPEP Local | Tenue de la première réunion du CAPEP National et du CAPEP Local. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 70%

✓ Cinq (5) projets exécutés en cohérence avec les orientations du SDAT : 1. Projet de restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière (RCA/Tchad) piloté par la FAO ; 2. Projet d'élaboration des Plans Locaux de Développement des trois communes de la zone réalisés par le PNUD ; 3. Projet BIOPALT (Biosphère et patrimoines du Lac Tchad) avec l'UNESCO qui se veut de créer une Réserve de Biosphère transfrontalière (RCA - Tchad) ; 4. Le soutien d'ARCADIA au bénéfice de la sécurisation du corridor écologique entre le PNBB et le PNMGSF ; 5. Le soutien de USFWS en faveur de la gestion de la transhumance et l'appui du Lion Recovery Funds pour des activités à développer de 2021 à 2022.

✓ Trois (3) projets opérationnels en 2021 en cohérence avec le SDAT à savoir : Le projet "Sécurisation du Parc National Manovo-Gounda St. Floris", financé par l'UNESCO ; et deux (2) initiatives de l'UE basées sur une approche Paysage : le projet BC Chari (Bloc Centre entre le Tchad et la RCA) ; et le projet PAIRIAC/Transhumance transfrontalière entre Tchad, RCA et Cameroun. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%

✓ Participation à cinq (5) réunions dans le cadre des plateformes transfrontalières : Trois (3) réunions (2 en visioconférence et 1 en présentiel) dans le cadre du mécanisme de suivi de la conférence de N'Djamena coordonné par la facilitation du PFBC ; une (1) réunion du Comité Directeur de la facilitation du PFBC ; une (1) réunion dans le cadre du Comité Tripartite de Planification et [...]



[...] d'Exécution (CTPE) de l'Accord Tripartite de N'Djamena, une (1) réunion dans le cadre de la Comité Tripartite de Supervision et d'Arbitrage (CTSA) de l'Accord Tripartite de N'Djamena. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%

✓ Développement sur le site de 6 projets dont les actions sont complémentaires à celles d'ECOFAC-6 :

Trois (3) projets concernant les questions transfrontalières et les actions complémentaires actifs au cours de la période : 1. Projet de restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière (RCA/Tchad) piloté par la FAO ; 2. Projet BIOPALT (Biosphère et patrimoines du Lac Tchad) avec l'UNESCO qui se veut de créer une Réserve de Biosphère transfrontalière (RCA - Tchad). 3. Le soutien de USFWS à WCS en faveur de la gestion de la transhumance.

Trois (3) projets concernant les questions transfrontalières et les actions complémentaires opérationnels en 2021 : Deux (2) initiatives de l'UE (avec pour opérateurs WCS) basées sur une approche Paysage : le projet BC Chari (Bloc Centre entre le Tchad et la RCA) ; et le projet PAIRIAC Transhumance transfrontalière entre Tchad, RCA et Cameroun. Le projet "Sécurisation du Parc National Manovo-Gounda St. Floris" sur financement de l'UNESCO a aussi comme opérateur WCS. VALEUR CIBLE ATTEINTE 100%


VOLET TRANSVERSAL 2

COMMUNICATION/VISIBILITÉ NATIONALE ET LOCALE

RÉSULTAT 6. Communication et intercommunication à l'échelle nationale, régionale et locale, ainsi que visibilité UE et ECOFAC-6

✓ Un plan de visibilité élaboré, un plan de communication élargi élaboré. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%

✓ Au moins 15 actions développées au cours de la période : 1. Campagne de sensibilisation pour prévenir le braconnage ; 2. Dossiers de presse ; 3. Outils de communication sur le CAP-PF-NE RCA ; 4. Boîte à outils pédagogiques graphiques sur les concepts liés aux écosystèmes ; 5. Newsletters trimestrielles ; 6. Contes sur la conservation pour les enfants d'âge scolaire ; 7. Cartes faciles à lire sur les zones du CAP-PF-NE RCA exclues à la transhumance ; 8. Lignes directrices et de canaux de communication pour renforcer la stratégie de gestion de la transhumance ; 9. Brochures illustrées à lecture facile sur le CAP-PF-NE et le programme WCS RCA ; 10. Matériels de sensibilisation sur le Code de Gestion de la Faune et des Aires Protégées ; 11. Production des postières et d'un kakémono sur le programme ; 12. Panneaux signalétiques pour la base opérationnelle de Bamingui et la base de Ndélé ; 13. Deux (2) interviews sur la Radio Ndélé pas loin en lien avec la tenue de 1^{ère} réunion du CAPEP Local ; 14. Production d'une banderole en lien avec la tenue de la 1^{ère} réunion du CAPEP Local ; 15. Séances de communication à la DUE, à l'Ambassade des États-Unis, à la FAO, au CICR et aux Ministères du Plan et de la Coopération, du Tourisme, des Travaux Publics et d'Élevage. VALEUR CIBLE ATTEINTE À PLUS DE 100%

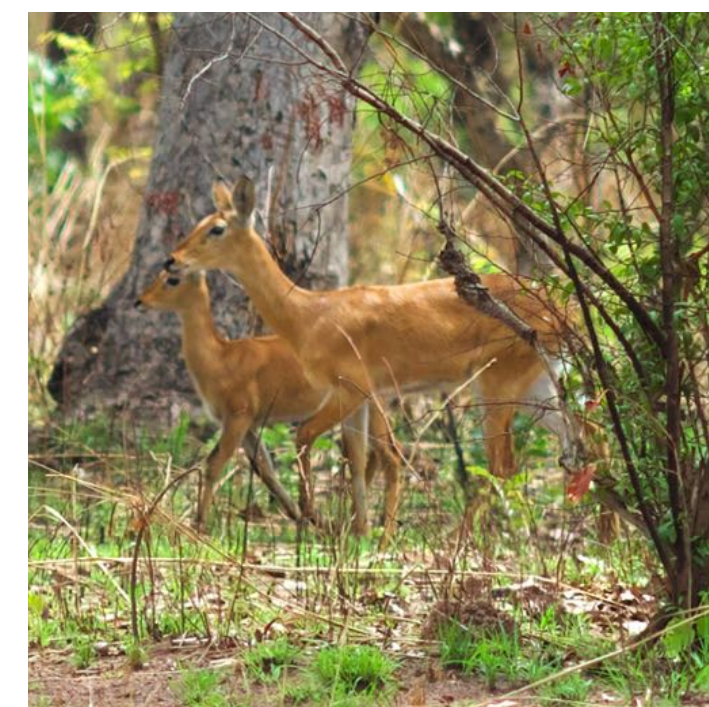

VOLET TRANSVERSAL 3

SUIVI-ÉVALUATION ET COHÉRENCE
AVEC LE PROGRAMME

RÉSULTAT 7. Monitoring, évaluation interne et cohérence-complémentarité avec le Programme WCS.

- ✓ Signature d'un premier avenant avec révision des indicateurs | 7 rapports trimestriels produits | 2 rapports intermédiaires produits | Instauration d'un système de rapportage hebdomadaire | Instauration d'un système de rapportage mensuel. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 100%
- ✓ Plusieurs ressources mobilisées pour améliorer l'impact et la durabilité du programme : Des modèles adoptés pour améliorer l'impact du programme (modèle Tango/Eco-régulateurs de la transhumance et salle de contrôle) ; développement de programmes transfrontaliers avec l'UE et l'UNESCO ; animation d'une plateforme transfrontalière coordonnée par la facilitation du PFBC ; interaction avec la première mission ROM. VALEUR CIBLE ATTEINTE À PLUS DE 100%
- ✓ Six (6) projets mis en cohérence ou orientés pour assurer une complémentarité avec ECOFAC-6.

Projets actifs au cours de la période : 1. Projet de restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière (RCA/Tchad) piloté par la FAO ; 2. Projet BIOPALT (Biosphère et patrimoines du Lac Tchad) avec l'UNESCO qui se veut de créer une Réserve de Biosphère transfrontalière (RCA - Tchad). 3. Le soutien de USFWS en faveur de la gestion de la transhumance.

Projets transfrontaliers opérationnels en 2021 : Deux (2) initiatives de l'UE basées sur une approche Paysage (le projet BC Chari [Bloc Centre entre le Tchad et la RCA] et le projet PAIRIAC Transhumance transfrontalière entre Tchad, RCA et Cameroun) ; et le projet "Sécurisation du Parc National Manovo-Gounda St. Floris", financé par l'UNESCO. VALEUR CIBLE ATTEINTE À PLUS DE 100%



VOLETS À DÉVELOPPER

VOLET SPÉCIFIQUE 1

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉSULTAT 1. Un SDAT, un PAG et trois PDT-L/PUT sont selon les cas préparés, ou bien révisés, validés et mis en œuvre par les parties prenantes.

- ✓ Les premiers intrants nécessaires à l'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement du Territoire sont générés, notamment la cartographie des infrastructures socio-économiques de base (éducation, santé, forage) et des acteurs présentes dans la zone d'intervention du projet. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 20%
- ✓ Trois (3) Plans de Développement Local avec le soutien du PNUD (Commune de Vassako, Commune de Mbollo-Kpata et Commune de Dar-El-Kouti). VALEUR CIBLE ATTEINTE À 30%

VOLET SPÉCIFIQUE 3

DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
ENDOGENE ET DURABLE DES POPULATIONS

RÉSULTAT 3. Les populations sont accompagnées vers un développement territorial endogène et durable à travers la mise en place de projets et mécanismes ambitieux dans plusieurs domaines, y compris à travers l'identification et l'accompagnement de PTFs.

- ✓ Le volet dispose d'une équipe fonctionnelle et animée par un responsable de volet ayant démissionné | Activité de renforcement de capacité du personnel amorcée au moyen des cours en ligne sur la gestion des services écosystémiques et valider leur certificat de formation | Recherche depuis la fin de l'année 2020 d'un nouveau coordinateur du volet pour remplacer le précédent démissionné. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 50%
- ✓ La cartographie disponible des acteurs opérant dans le Complexe des Aires Protégées du Nord-Est RCA disponible | Les partenaires sont identifiés et contactés dont PU, NRC, NDA | Il reste à engager ces partenaires dans la mise en œuvre des actions. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 40%
- ✓ La cartographie de l'ensemble des acteurs intervenant dans la zone est réalisée | Une note technique produite, décrit la stratégie d'implémentation des actions à mettre en place en vue d'atteindre les résultats escomptés dans le cadre du volet | Les données documentaires devant alimenter l'étude socioéconomique approfondie prévue sont collectées et archivées | Il reste à réaliser une enquête approfondie censée instruire les propositions de partenariats et les actions à développer. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 30%



- ✓ Elaboration des protocoles d'Accord de Collaboration avec les communautés locales pour la conservation du Complexe des Aires Protégées du Nord-Est RCA | Six (6) associations de jeunes de Bamingui collaborent avec ECOFAC-6 à expérimenter une campagne de pêche durable dans la ZCV Koukourou-Bamingui | Les actions importantes dans chacune des trois ZCV (TeDED) partenaires du projet, avec inclusion suffisante des jeunes et des femmes et les ALGEST-RN sont conditionnées à la mise en place des TeDED. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 25%
- ✓ Contact noué avec le BIOPALT/UNESCO en vue du développement des AGR à base d'économie verte (miel et beurre de karité) | Contacts et réunions avec les spécialistes et les organisations telles que CICR et OIM qui entendent développer des projets à caractère socio-économique dans la région | Le but ultime est de pouvoir développer en mettant à contribution plusieurs partenaires ou sources de financement "au moins 2 ou 3 projets significatifs" différents qui concernent plusieurs ALGEST-RN, avec une participation importante de la population y compris des jeunes et des femmes. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 25%
- ✓ Le développement des actions adaptées pour permettre la réussite des projets dans le cadre des TeDED n'est pas à l'ordre du jour à ce stade.
- ✓ Les études permettant de proposer des solutions pertinentes, viables et durables de microcrédit/financement sont sans objet à ce stade du chronogramme.
- ✓ Elaboration du projet d'Accord de Collaboration avec le Haut-Commissariat Chargé de la Jeunesse Pionnière (JPN) et WCS RCA en vue du lancement de la formation civique et socioprofessionnelle des jeunes. Le but est d'en arriver à former 100 jeunes par an à partir de 2020. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 10%
- ✓ Production des devis de réhabilitation et d'élargissement des bâtiments de Centre de Formation de Bamingui dans l'optique de les rendre opérationnels. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 5%
- ✓ Au moins 50% des stagiaires démarrent des activités durables en lien avec leur formation. L'activités inductrices de ce valeur cible n'est pas à l'ordre du jour à ce stade du chronogramme.
- ✓ Réalisation de la cartographie des acteurs et identification des domaines de partenariat | Deux (2) partenaires (OCHA et Solidarité Internationale) mobilisés et coordonnés pour des appuis humanitaires aux populations locales confrontées au conflit


interethnique du 1^{er} semestre 2020 à Ndélé et à l'avènement du COVID-19. Ces activités auxquelles s'ajouteront d'autres s'inscrivent dans l'optique d'assurer une identification-accompagnement permanentes des opérateurs et autres acteurs. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 25%

- ✓ Identification et accompagnement de cinq (5) initiatives avec des résultats significatifs obtenus ou entrevus :

Une (1) initiative active au cours de la période accompagnée. Celui de la MINUSCA qui a apporté un appui à la mise en place d'ateliers de couture pour les handicapés de Bamingui et Ndélé | Appui conseil à l'ONG PU dans le cadre de la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire au profit des communautés des communes de Vassako et de Mbollo-Kpata | Appui conseil au sous bureau de l'OIM de Ndélé dans le choix des microprojets générateurs de revenus au bénéfice des ex combattants.

Deux (2) initiatives actives en 2021 avec pour opérateur WCS : 1. Développement des AGR à base d'économie verte (miel et beurre de karité) en synergie le projet BIOPALT/UNESCO ; 2. Développement d'activités communautaires dans le cadre du projet transfrontalier Bassin Central Chari financé par l'UE.

Deux (2) concertations initiées avec OIM et CICR pour mener en synergie les programmes communautaires prévus dans le cadre d'ECOFAC-6. VALEUR CIBLE ATTEINTE À 40%

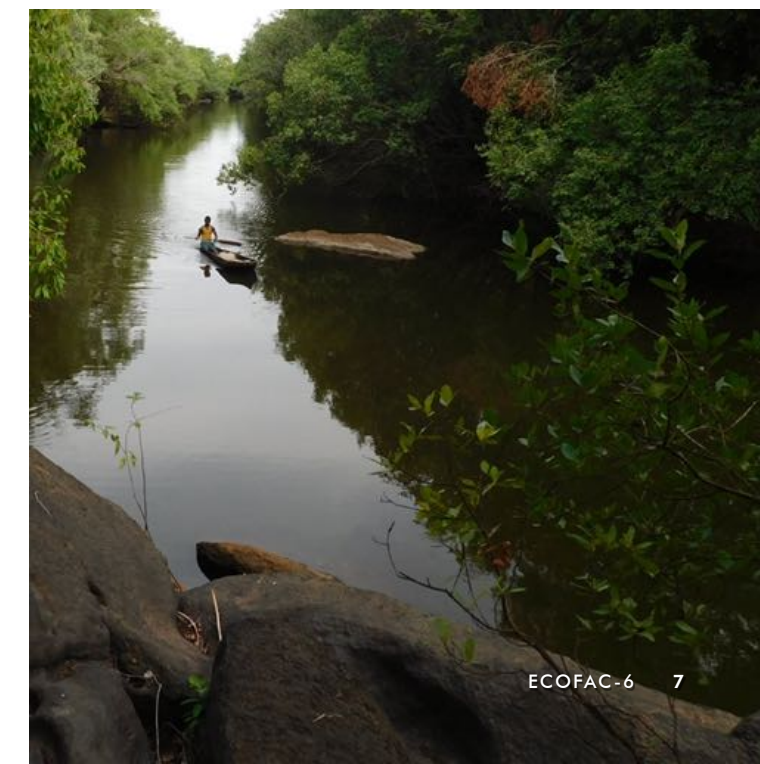

2 DIFFICULTÉS, OBSTACLES ET PROBLÈMES RENCONTRÉS

- Nombreux faits d'insécurité qui perturbent ou paralysent les activités du programme et de surcroît occasionnent la démotivation et le départ de certains expatriés.
- L'apparition de la pandémie du COVID-19 qui a occasionné la suspension des activités du volet Développement Socioéconomique et du volet Aménagement du Territoire, et retardé le lancement du volet Gestion de la Transhumance.
- L'insuffisance des armes et des munitions qui fait obstacle au recrutement de nouveaux éco-gardes et à l'élargissement de l'emprise du programme sur l'ensemble de sa zone d'intervention.
- Les manipulations politiques tendant à imposer des exigences au programme et à inciter les populations locales à se soulever contre sa direction.
- La forte pression des populations de la Nana-Gribidzi sur le Parc National Bamingui-Bangoran.
- L'incursion régulière des braconniers locaux dans la partie Sud-Est de la zone d'intervention du programme du côté de la Commune de Mbollo-Kpata.
- La difficulté pour raison d'insécurité à convaincre des compétences nantis de bon profil à venir travailler dans le Nord-Est RCA.



3 RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES MOBILISÉES POUR RENFORCER LE PROGRAMME:

PROJECT:

Securing lion populations in priority protection zones in North-Eastern CAR

\$ 451,640

LION RECOVERY FUNDS

DEUX (2) ANS | 2021

PROJECT:

Sécurisation du Parc National Manovo-Gounda St. Floris

\$ 900,000

PROJECT:

Appui à la gestion et à l'aménagement territorial transfrontalier du Bassin Central du fleuve Chari

€ 5,000,000

UNION EUROPÉENNE

QUATRE (4) ANS | 2021

PROJECT:

Manovo-Gounda St. Floris & Bamingui-Bangoran

\$ 180,000

ARCADIA FUNDS

UNE (1) ANNÉE | 2020 - 2021





**PROGRAMME ÉCOSYSTÈMES FRAGILES D'AFRIQUE CENTRAL | ECOFAC-6
COMPOSANTE COMPLEXE DES AIRES PROTÉGÉES
DU NORD-EST DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE**

Wildlife Conservation Society
rca@wcs.org
wcs.org
